第二部分　验收意见

宿迁东方雨虹建筑材料有限公司
东方雨虹建筑材料项目（一期：第一阶段）
配套废水、废气、噪声、固废污染治理设施
竣工环境保护验收意见

2024 年 3 月 1 日，宿迁东方雨虹建筑材料有限公司根据竣工环境保护验收监测报



设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求，组织验收组（名单附后）对“东方雨虹建筑材料项目（一期：第一阶段）”

	[redacted]	砂浆（腻子粉、		10万			10万	30万

[redacted]

3	美缝剂生产线	美缝剂	1条	1200万支	1200万支	1条	1200万支	1200万支

4、项目设备清单见表2。

表2-1 高分子防水卷材主要设备清单

[redacted]

序号	设备名称	规格参数		环评设计数量（台/套）	实际数量（台/套）	增减数量（台/套）
		环评设计	实际			
1	聚异丁烯计量罐	1000L	1000L	1	1	0
2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

[redacted]

1	[redacted]					
	成品砂上料系统					
2	[redacted]					

3	石英砂上料系统	干砂提升机	1	1	0
4		砂投料组件	1	1	0
5	砂水泥计量系统	砂累加计量系统	2	4	+2
6		[redacted]	2	4	+2
7	外加剂计量系统		4	4	0
8	搅拌系统	[redacted]	1	1	0
9				2	+1
10	成品料输送系统		2	2	0
11	大包装系统	包装仓	2	2	0
12		包装机	7	7	0
13		袋装输送机	2	2	0
14	小包装系统	包装仓	1	1	0
15		包装机	2	2	0
16	其他配套设备	粉罐	4	4	0
17		外加剂仓（4.5m³）	9	9	0
18		外加剂仓（2m³）	9	9	0
19		砂罐（50m³）	10	10	0
20		砂罐（隔仓 50m³）	2	2	0
21		风机	10	10	0

表 2-3 美缝剂主要设备清单

序号	设备名称	规格型号		环评设计数量（台/套）	实际数量（台/套）	增减数量（台/套）
		环评设计	实际			
1	环氧树脂储罐 1	150m³	100m³	1	1	0
2	环氧树脂储罐 2	50m³	80m³	1	1	0
3	半自动灌装线	/	/	8	4	0
4	全自动灌装线	/	/	8	12	+4
5	A 胶分散釜	有效容积	有效容积	2	3	+1

		2.5m³	1.5m³			
6	A 胶中转罐	有效容积 5-6m³	有效容积 5-6m³	2	2	0
7	搅拌釜	有效容积 3.4m⁴	有效容积 2.5m⁴	3	4	+1
8	树脂高位槽	有效容积 2-3m³	有效容积 2-3m³	1	1	0
10	落地式分散机	/	/	2	13	+11
11	拉缸	容积 400L	容积 400L	4	4	0
12	真空缓冲罐	/	/	2	2	0


（二）建设过程及环评审批情况

宿迁东方雨虹建筑材料有限公司位于江苏省宿迁高新技术产业开发区张家港大

三、环境保护设施建设情况

（一）废水


本项目产生的废水主要为生活污水、车间拖地废水、初期雨水。生活污水和车间拖地废水经化粪池处理后，与初期雨水一并接管至城东污水处理厂集中处理

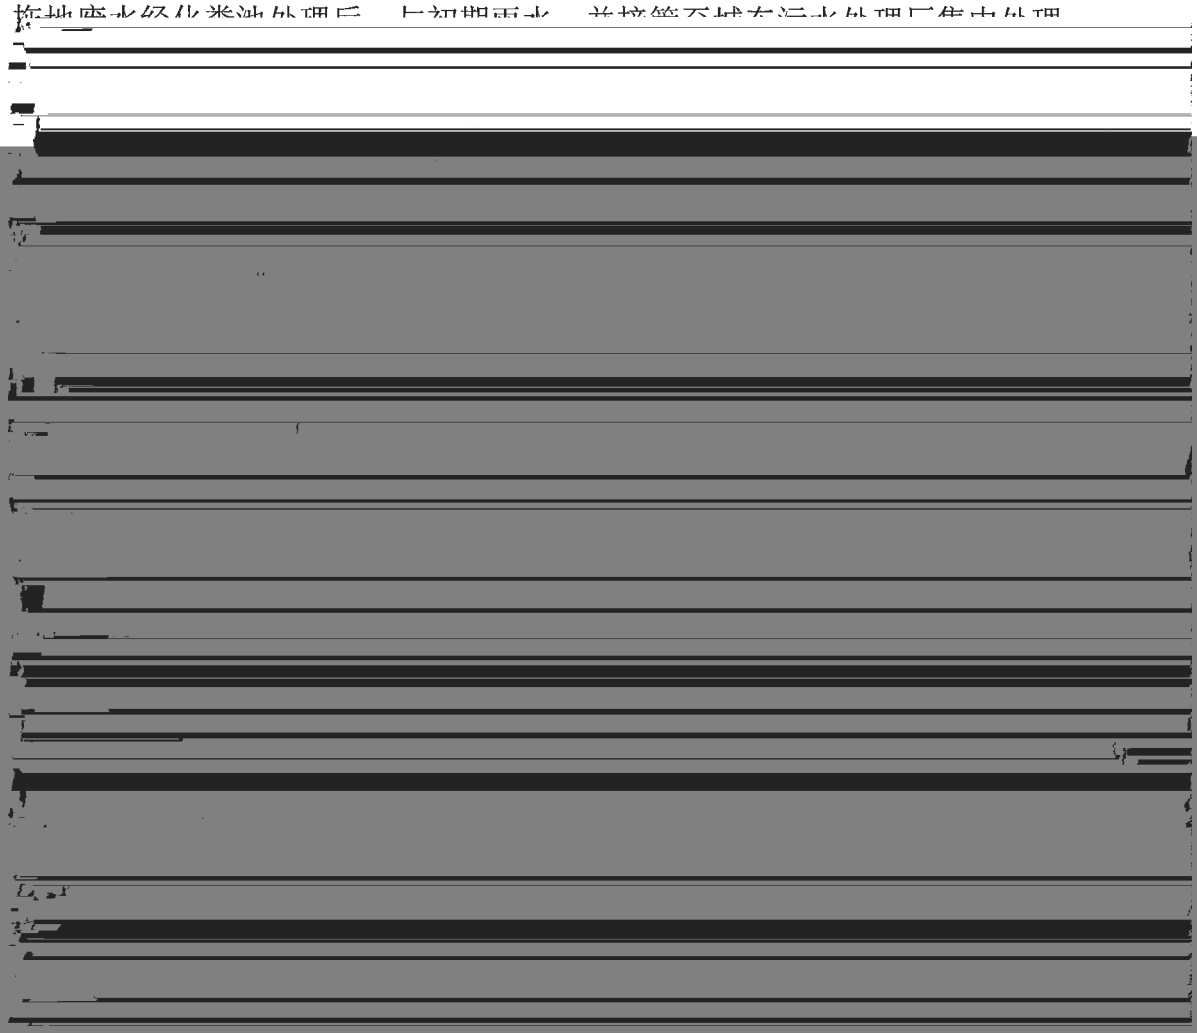


（二）废气



（2）废气：验收监测期间，[redacted]

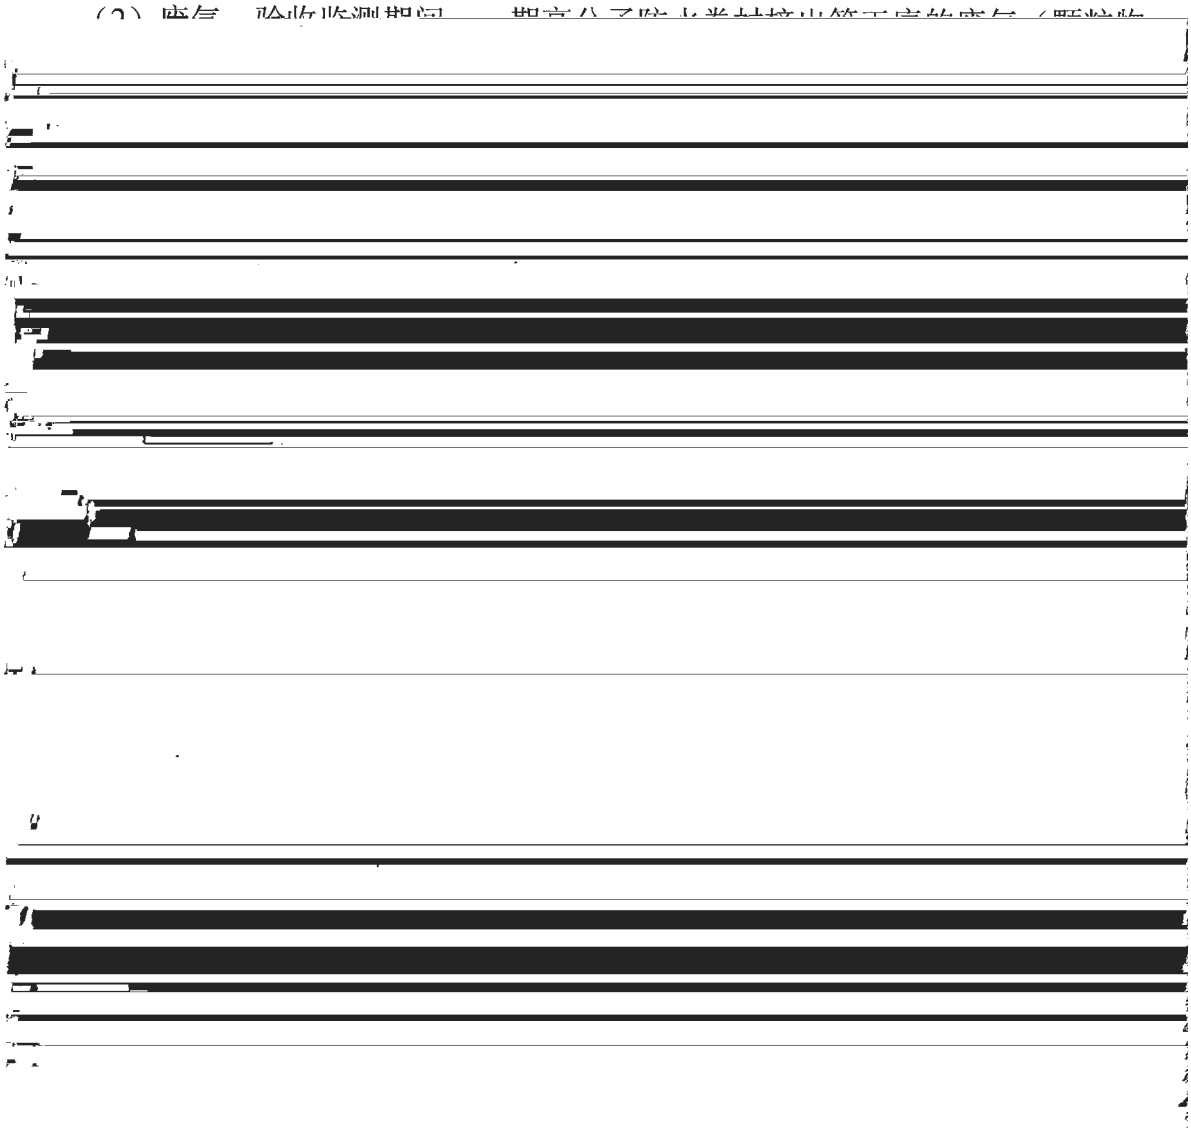

非甲烷总烃）排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572—2015）表 5 和表 9 的规定；砂浆生产线的废气（颗粒物）排放执行江苏省《水泥工业大气污染物



进一步提高企业的环保意识。

(3)加强日常运行环境管理以及环保设施维护、管理，确保各污染源稳定达标排放。

验收组成员：

宿迁东方雨虹建筑材料有限公司

2024年3月1日



表

年 3月 1 日

签名
